

Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

CNPJ: 09 016 472/0001-07

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 22/02/2013




MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - REO

IDENTIFICAÇÃO						
Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC.				PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) PARCIAL () FINAL		
				Ref. Parcela(s) nº	02	Referente Mês (es) Março/Abril/Maio/ 2019
Empenho nº 11516/ 2018	Valor da Parceria 500.000,00	Qtde e Valor da Parcela 2 - 250.000,00	Conta nº 52.975-3	Banco Banco do Brasil	Agência 0508-8	14 - Termo de Fomento /Colaboração Nº20/2018

AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS CONFORME PLANO DE TRABALHO							
Nº ordem da Meta	Descrição da Meta	Descrição das Atividades para o cumprimento da Meta	Unidade de medida	Indicador Físico			
				Previsto P.Trabalho	Executado no Período	Resultado	
				Qtde.	Qtde.	Exc	Defic
01	Auxílio financeiro para aquisição de materiais de construção para uso externo e interno na obra do Hospital de Câncer do Noroeste Mineiro no Bloco 02 (Zero Dois) de imagenologia.	Aquisição de granito para o piso e bancadas, salas, consultórios e banheiros do Hospital e; Aquisição de Elevador.	Construção do hospital do câncer do Noroeste Mineiro, para oferta de atendimento na área de oncologia, situado no município de Unaí Minas Gerais.	Aquisição de 40% dos materiais de construção do Hospital de Câncer Noroeste Mineiro.	Aquisição de 700,892 m2-, cargas de granito para a construção do hospital de Câncer, Aquisição de 1 de elevador. Os quais serão instalados de acordo com o andamento da obra.	-	-
		Realização de cotação de preços para efetivação das compras, e aquisição dos materiais necessários com menor custo.	Construção do hospital do câncer do Noroeste Mineiro, para oferta de atendimento na área de oncologia, situado no município de Unaí Minas Gerais.		Compra de 700,892 granito m2, e elevador	-	-
02	Viabilizar a aquisição dos materiais para a construção do hospital.	Comprovação de aquisição dos materiais para a construção, via nota fiscal, comprovante de pagamentos mediante transferência online aos fornecedores e registros fotográficos os materiais obtidos, conforme segue em anexo.	Construção do hospital do câncer do Noroeste Mineiro, para oferta de atendimento na área de oncologia situado no município de Unaí Minas Gerais.		Compra de 700,892 granito m2, e elevador.	-	-



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

CNPJ: 09 016 472/0001-07

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 22/02/2013

RELATÓRIO

"Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados" (Lei Federal 13.019/2014, art. 66, I). Anexar: documentos de comprovação da realização das ações, tais como lista de presença, fotos, impressos sobre a divulgação das atividades/projeto, planilhas de controle dos serviços prestados etc.

Ações Programadas:

Aquisição de materiais de construção em prol da edificação da obra - Hospital de Câncer do Noroeste Mineiro-HOCANOM.

Ações Executadas:


- Realização de cotações e orçamentos para obtenção dos materiais de construção.
- Aquisição de 2 cargas de granito.(700,892 m2).
- Aquisição de elevador.

Benefícios Alcançados:

Mediante parceria da ANMECC com a prefeitura municipal de Unaí-MG, e repasse de 500 mil, está sendo possível à aquisição dos materiais/equipamentos propostos no plano de trabalho. Benefícios que serão evidenciados ao decorrer de todo a conclusão da obra do Hospital de Câncer .

Dificuldades Encontradas:

A ANMECC enfrentou dificuldades com relação ao tempo de execução considerado no projeto da parceria, a associação não conseguiu adquirir todos os materiais de acordo com o plano de trabalho no tempo previsto. Em razão da interdependências das etapas de uma obra, é necessário aguardar a finalização de algumas etapas para a compra dos materiais . Por estes motivos foi necessário solicitar prorrogação do prazo de execução a prefeitura municipal de Unaí. Cujá vigência será de novembro de 2018 á dezembro de 2019.



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

CNPJ: 09 016 472/0001-07


Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 22/02/2013

Demonstrativo fotográfico da execução do objeto

Foto 1

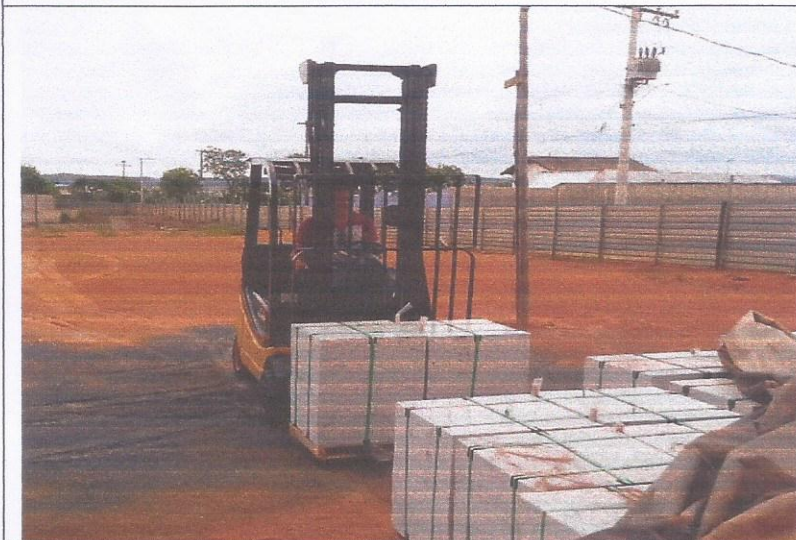

Descrição: Granito comprado em março de 2019, destinado para construção do hospital de câncer.

Foto 2



Descrição: Granito comprado em março de 2019, destinado para construção do hospital de câncer.

Foto 3



Descrição: Granito comprado em março de 2019, destinado para construção do hospital de câncer.

Foto 4



Descrição: Granito comprado em março de 2019, destinado para construção do hospital de câncer.



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

CNPJ: 09 016 472/0001-07

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 22/02/2013

Foto 5



Descrição: Elevador (peças e acessórios) que serão instalados ao decorrer da obra. Comprado em março de 2019. Destinado a instalação na construção do hospital de câncer .

Foto 6




Descrição: Elevador (peças e acessórios) que serão instalados ao decorrer da obra. Comprado em março de 2019. Destinado a instalação na construção do hospital de câncer.

Foto 7



Foto 8





Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

CNPJ: 09 016 472/0001-07

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 22/02/2013


Descrição: Elevador (peças e acessórios) que serão instalados ao decorrer da obra. Comprado em março de 2019. Destinado a instalação na construção do hospital de câncer

Foto 9



Descrição: Elevador (peças e acessórios) que serão instalados ao decorrer da obra. Comprado em março de 2019. Destinado a instalação na construção do hospital de câncer.


Foto 10

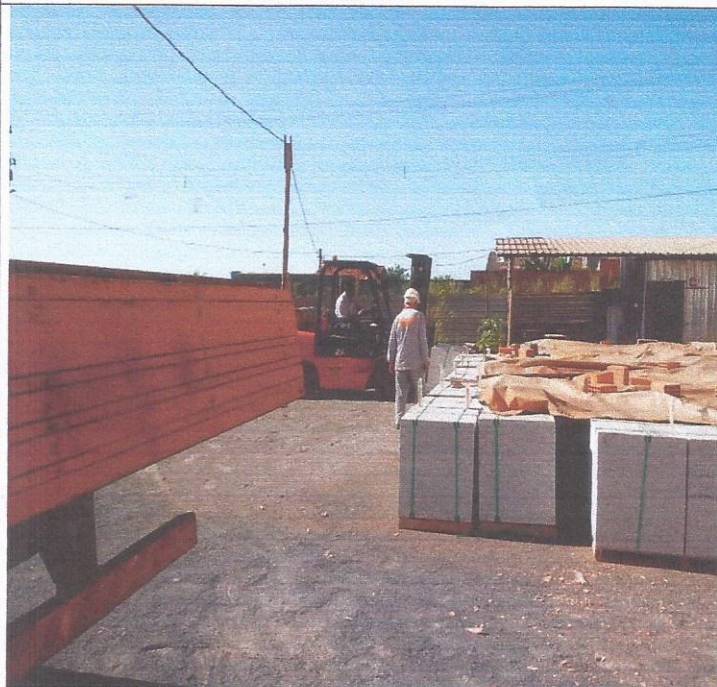


Descrição: Granito comprado em Abril de 2019 destinado para construção do hospital de câncer.

Descrição: Granito comprado em Abril de 2019 destinado para construção do hospital de câncer.

Foto 11

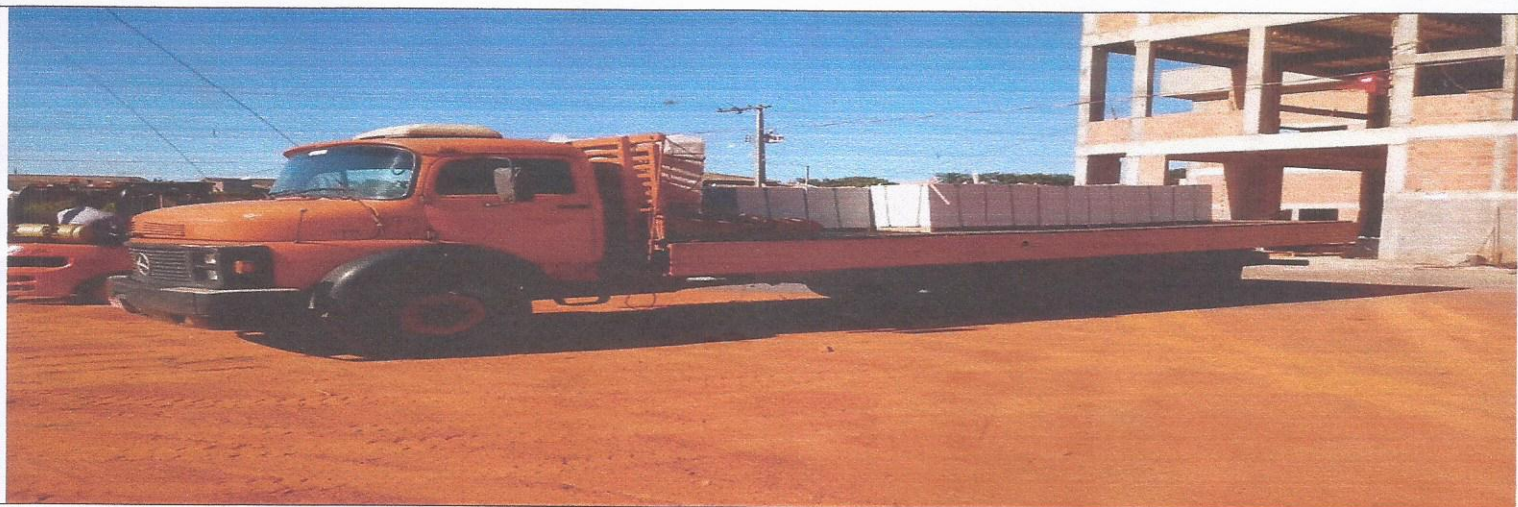

Descrição: Granito comprado em Abril de 2019 destinado para construção do hospital de câncer.



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC
CNPJ: 09 016 472/0001-07

Utilidade Pública Municipal Lei 2.531 de 28/12/07

Utilidade Pública Estadual Lei 19.111 de 09/09/2010

Utilidade Pública Federal Portaria nº 605 de 22/02/2013

Considerações Finais:

Consideramos que o recurso da parceria com a prefeitura municipal de Unaí, contribui de forma significativa para a construção do hospital de Câncer no Noroeste Mineiro. Uma vez que a ANMECC não dispões de recursos próprios, e através das parcerias, realização de eventos e doações da comunidade, clubes e serviços, está sendo possível continuar na realização desse objetivo.

Declaração do Dirigente da OSC

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório e que o mesmo encontra-se publicado na internet no endereço <https://hospitaldoamornoroeste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art.11 da Lei 13.019/2014. Os documentos comprobatórios do atingimento dos resultados aqui expostos se encontram à disposição para análise do Gestor e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Unaí/MG 31 de Maio de 2019

Belchior Luiz de Melo

Presidente

Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

Fonte: Modelo disponibilizado pela Controladoria Interna e de Transparência Pública - Município de Unaí-MG



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC



MUNICÍPIO DE UNAÍ – MG
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - REFF

(Lei Federal 13.019/2014, art. 66, II)

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Organização da Sociedade Civil:

Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer-ANMECC

Objeto:
Aquisição de materiais de construção em prol da construção do Hospital do Câncer do Noroeste Mineiro

03 - CNPJ:

09 016 472/ 0001-07

04 - Endereço
Praça São Cristovão, 105, Sala 04- Bairro Barroca

05 - Município:

UNAÍ

MG

07 - Telefonos:

(38) 3676-4922

08 - Empenho nº	09 - Valor da Parceria
11516/18	R\$

R

500.000,00

- Quid e Valor da Parcela

RS 2

11 - Conta n°

52975-

12 - Banco

Bras

13 - Agência

0508

14 - Termo de Fomento /
Colaboração n.º:

20/2018

01/11/18 a 31/12/19

BLOCO 2.A - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ACUMULADO (R\$)

01 - Total Repassado acumulado (+)	02 - Total de Recursos Próprios (Restituição de despesas não autorizadas) (+)	03 - Total de Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	04 - Total da Receita (-)	05 - Total da Despesa Realizada Autorizada (-)	06 - Total da Despesa Realizada Não Aprovada Restituída (-)	07 - Total da Despesa(=)	08 - Saldo Final (Reprogramado em seguinte) (=)	09 - Devolução de Recursos
RS 500.000,00	RS 325,00	RS 4.149,69	RS 504.474,69	RS 221.302,61	RS 192,00	RS 221.494,61	RS 282.980,08	RS -

BLOCO 2.B - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - NO PERÍODO DESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

01 - Saldo Inicial ou Anterior reprogramado (+)	02 - Valor da Receita - Creditado no Período(+)	03 - Recursos Próprios (Restituição de despesas não autorizadas) (+)	04 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	05 - Valor Total da Receita (=)	06 - Valor da Despesa Realizada Autorizada (-)	07 - Valor da Despesa Realizada Não Aprovada Restituída (-)	08 - Saldo Final do período (Reprogramado mês seguinte) (=)	09 - Devolução de Recursos
R\$ 188.248,12	R\$ 250.000,00	R\$ 325,00	R\$ 1.658,89	R\$ 440.232,01	R\$ 157.231,93	R\$ 20,00	R\$ 282.980,08	R\$ -

BLOCO 3.A - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS AUTORIZADAS (D.A.)

[illegible]

TOTAL (BLOCO 3.A).....R\$ 157.231,93

BLOCO 3.B - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS "NÃO" AUTORIZADAS (D.N.A.)

01 - Item	02 - Nome do Credor/Favorecido	03 - CNPJ ou CPF do Credor/Favorecido	04 - Tipo de Bens Adquiridos ou Serviços Contratados - Ver Plano de Trabalho (vinculação com a execução do objeto)	05 - Documento			06 - Pagamento		07 - Valor R\$	08 - Observação
				Tipo	Número	Data	Número da Transferência	Data		
1	Banco Brasil		Tarifa Pacote se Serviço	TB	13113	22/04/19	871120901202798	22/04/19	20,00	
2										
TOTAL (BLOCO 3.B).....R\$									20,00	

TOTAL GERAL 3.A + 3.B (Despesas Autorizadas + Despesas Não Autorizadas) R\$ 157.251,93

BLOCO 4 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO (RS)

4.1. DESPESAS com RECURSOS HUMANOS (Folha de pagamento, encargos trabalhistas e substituições de funcionários em férias)

01 - Item	02 - Qtd	03 - Profissionais Sociais e Trabalhistas	04 - Encargos Carga Horária	05 - Salário Base do Cargo/Função e/ou Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações		08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$
1								
5								
TOTAL (BLOCO 4.1).....R\$								0,00

4.2. DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS

01 - Item	02 - Discriminação da despesa (telefone, água, energia, internet, licenças, treinamentos, mão de obra, eventos etc)	03 - Qtd	04 - Unidade	05 - Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações	08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$
1							
2							
3							
TOTAL (BLOCO 4.2).....R\$							0,00

4.3. MATERIAL DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO

01 - Item	02 - Discriminação da despesa (Material de limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios etc)	03 - Qtd	04 - Unidade	05 - Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações	08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$
1	Virginia Marmores e Granitos Ltda	350	m2		15/03/2019		30.878,49
2	Seral Otis Ind Metalurgica Ltda	01	unidade		22/03/2019		95.474,95
3	Virginia Marmores e Granitos Ltda	350	m2		22/04/2019		30.878,49
4							
TOTAL (BLOCO 4.3).....R\$							157.231,93

TOTAL GERAL 4. (Síntese da Execução Financeira conforme Plano de Trabalho) (Soma dos totais: 4.1+4.2+4.3+4.4)..... R\$ 157.231,93


Obs.: O valor do Total Geral 4, deve ser igual ao Total da Despesa Realizada Autorizada constante do item 5, do Bloco 2, A - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade e que esse Relatório e as demais informações relativas à Prestação de Contas dessa Parceria está publicada na internet no endereço : <https://hospitaldoanomoroeste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art. 11 da Lei 13.019/2014.

Unai/MG., 11 de Junho de 2019

Local e data


Odécio Onei Oppelt
Contador
Contador-CRC-MG 044039/O-9
CPF 307.748.880-91
FONE (38) 3676-2989


Belchior Luiz de Melo
Presidente da OSC

BLOCO 6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

1
2
3

Fonte: Modelo disponibilizado pela Controladoria Interna e de Transparência Pública - Município de Unai-MG


Obs.: O valor do Total Geral 4. deve ser igual ao Total da Despesa Realizada Autorizada constante do item 5. do Bloco 2.A - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO


Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade e que esse Relatório e as demais informações relativas à Prestação de Contas dessa Parceria está publicada na internet no endereço : <https://hospitaldoamornoroeste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art.11 da Lei 13.019/2014.

Unai/MG., 11 de Junho de 2019

Local e data


Odécio Onei Opelt

Contador



Belchior Luiz de Melo

Presidente da OSC

BLOCO 6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

1
2
3

Fonte: Modelo disponibilizado pela Controladoria Interna e de Transparência Pública - Município de Unai-MG



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

MUNICÍPIO DE UNAÍ – MG
PODER EXECUTIVOMROSC – PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Organização da Sociedade Civil:				PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) PARCIAL () FINAL		
Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC				Ref. Parcela(s) nº	1-2/2	Referente Mês (es) Março /Abril à maio/19
Empenho nº	Valor da Parceria	Qtde e Valor da Parcela	Conta nº	Banco	Agência	14 - Termo de Fomento / Colaboração nº: 20/2018
11516/2018	500.000,00	2 R\$ 250.000,00	52975-3	B. BRASIL	0508-8	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO)

Ordem	Data de apresentação da Prestação de Contas	Referente (Meses)	Receitas			Despesas			SALDO EM CONTA
			Repasse	Recurso Próprio	Rendimento	Autorizadas	Não Autorizadas (Restituídas)	Devolução de Recursos	
1	28/02/19	Novembro /18	R\$ 250.000,00		419,31		76,00		250.343,31
2	28/02/19	Dezembro /18			R\$ 718,90	30.878,49	57,00	0,00	220.126,72
3	28/02/19	Janeiro /19			R\$ 722,20	30.878,49	19,00		189.951,43
	28/02/19	Fevereiro/19			R\$ 630,39	2.313,70	20,00		188.248,12
	11/06/19	Março/19	R\$ 250.000,00	325,00	R\$ 601,58	126.353,44			312.821,26
	11/06/19	Abril/19			R\$ 836,19	30.878,49	20,00		282.758,96
	11/06/19	Maio/19			R\$ 221,12				282.980,08
TOTAL R\$			500.000,00	325,00	4.149,69	221.302,61	192,00	0,00	282.980,08

Saldo em Conta Corrente R\$: 0,00


Saldo em Conta Aplicação R\$: 282.980,08

Saldo Total R\$: 282.980,08

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade e que esse Relatório e as demais informações relativas à Prestação de Contas dessa Parceria está publicada na internet no endereço : <https://hospitaldoamornoroeste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art.11 da Lei 13.019/2014.

Unaí/MG., 11 de junho de 2019

Local e data


Odécio Onei Oppelt
contador / Tesoureiro

Odécio Onei Oppelt
Contador-CRG-MG 04403810-9
CPF 307 748 880-91
FONE (38) 3676-2989


Belchior Luiz de Melo
Presidente da Osc
